FastReqs WBS · 계획과 현재 진척

최종 마감 2026-12-20 / 팀 3명 × 주 3시간 / Slack 봇 + 사용자 CLI / 시연용 프로그램

전체 목표

Slack 대화·MP3 회의에서 기존 문서와 비교해 요구사항 변경안을 제시하고, 사람 승인 후 사용자별 로컬 Markdown에 반영한다.

실행 구조

연구실 PC의 봇은 상시 감지·보관한다. 사용자 문서 비교·수정은 CLI가 켜져 있을 때만 가능하다. CLI 종료 시 대화를 보관하고 재연결 후 최신 문서와 비교한다. 별도 백그라운드 에이전트는 만들지 않는다.

현재 진척

주제·제안서만 완료(사용자 보고). 신규 개발은 모두 미착수이며 계획 노력 기준 0/90시간이다. 본 문서 작성과 팀의 범위 검토 완료를 구분한다.

계획·비용

신규 작업 90시간, 각자 30시간. 11개 주 단위의 가용량 99시간 중 9시간을 12/14~12/20 여유로 둔다. 첫 부분 주에도 각자 3시간 가능하다고 가정한다. API 예산은 총 30,000원이며 교수 지원 여부는 미정이다.

검토·제출

10/7 팀 검토용 초안을 공유한다. 중간발표는 다음 주이며 정확한 날짜는 미정이다. 최종 리허설을 12/13까지 계획하고 12/20까지 제출·결함 대응을 마친다.

추정의 한계


작업당 3시간은 아직 검증하지 않은 계획값이다. 주 3시간 제약에 맞춘 작은 패키지이며 강의의 일반 8~80시간 기준보다 작다. 기술 실험 후 재추정하고 필요하면 팀이 일정·범위를 합의한다.

남은 결정

언어·AI/음성 API·PC 운영체제·사용자 연결 및 인증·MP3 업로드·정확한 중간발표일·문서별 승인 묶음을 첫 단계에서 확정한다.

트리형 WBS · 전체 개요


레벨 0 프로젝트 목표와 레벨 1의 다섯 단계. 작업은 다음 다섯 상세 트리에서 확인한다.

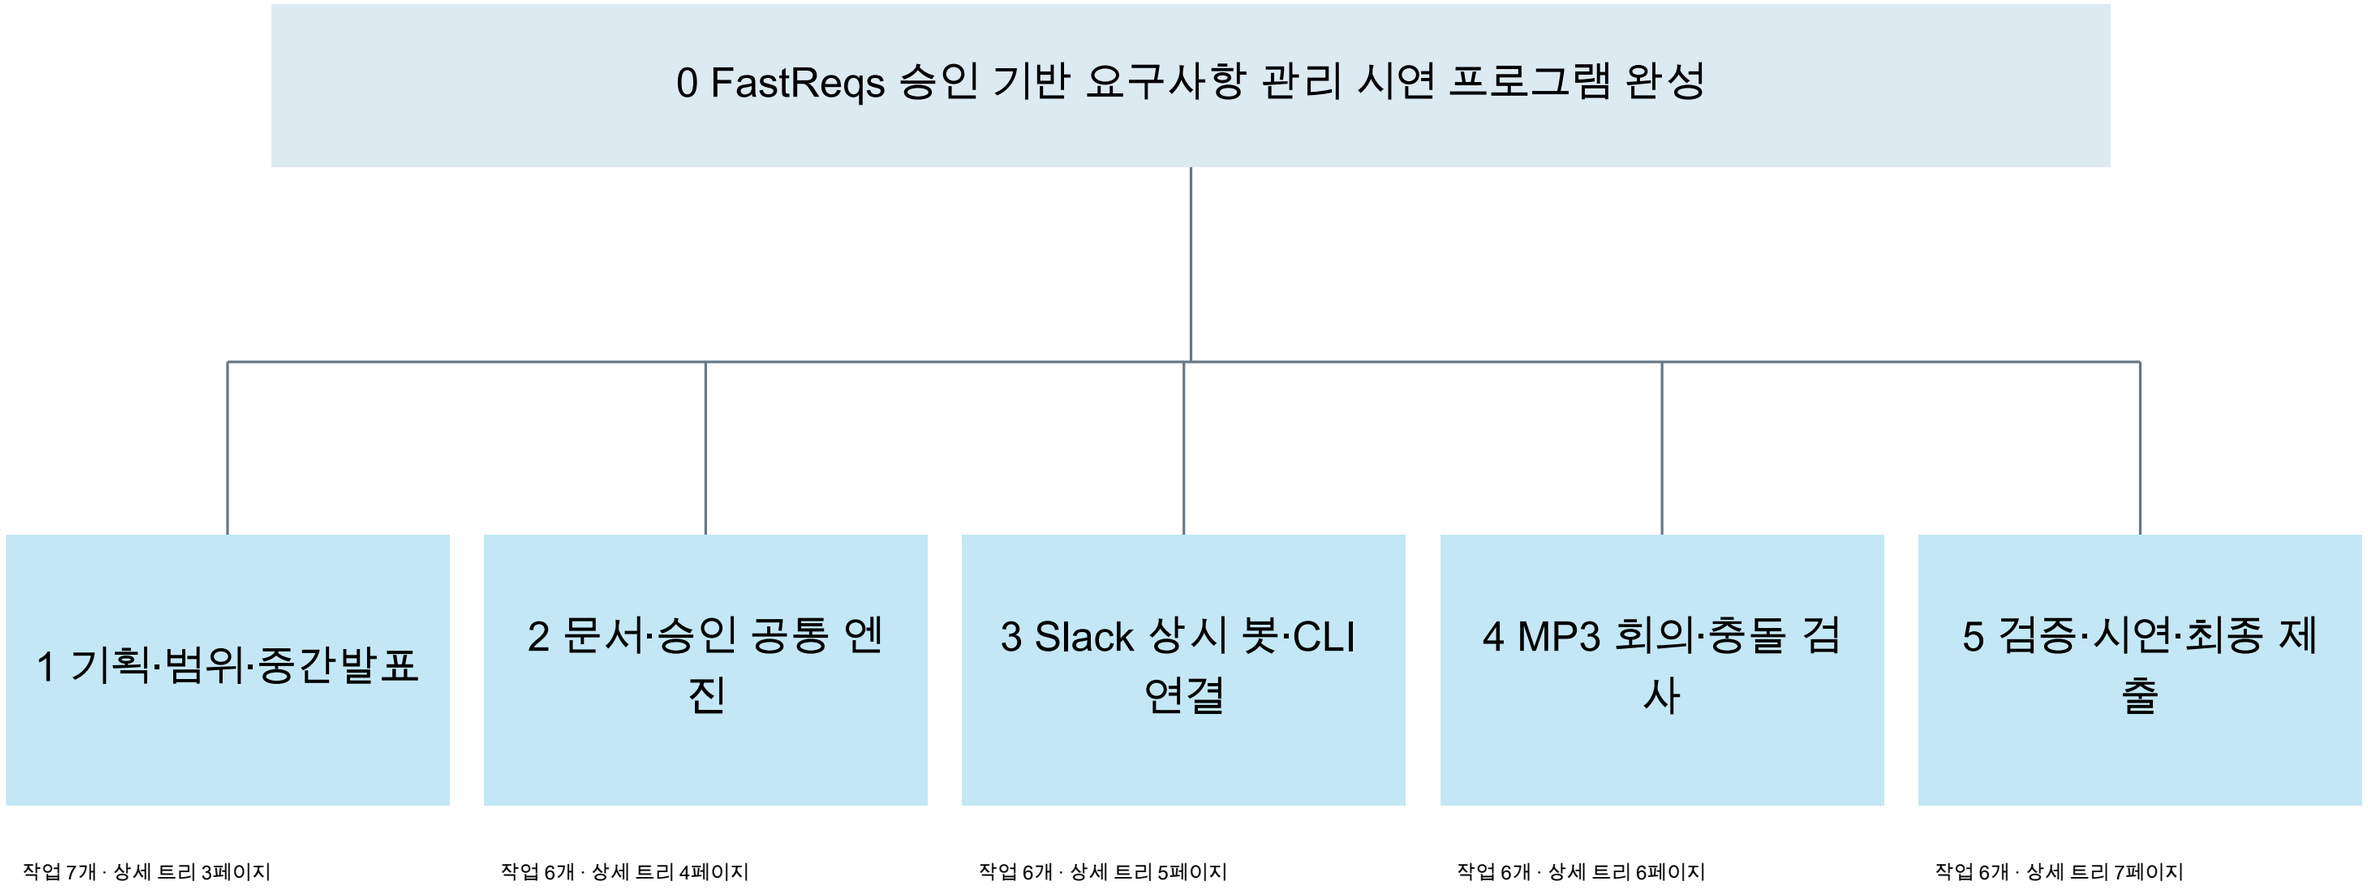

트리의 선은 작업 범위의 상위·하위 관계다. 선행 관계·기간·완료도는 표에서 확인한다.

단계별 상세 트리 · 1 기획·범위·중간발표


전체 목표 → 해당 단계 → 동급 작업. 모든 작업 번호는 계획표와 동일하다.

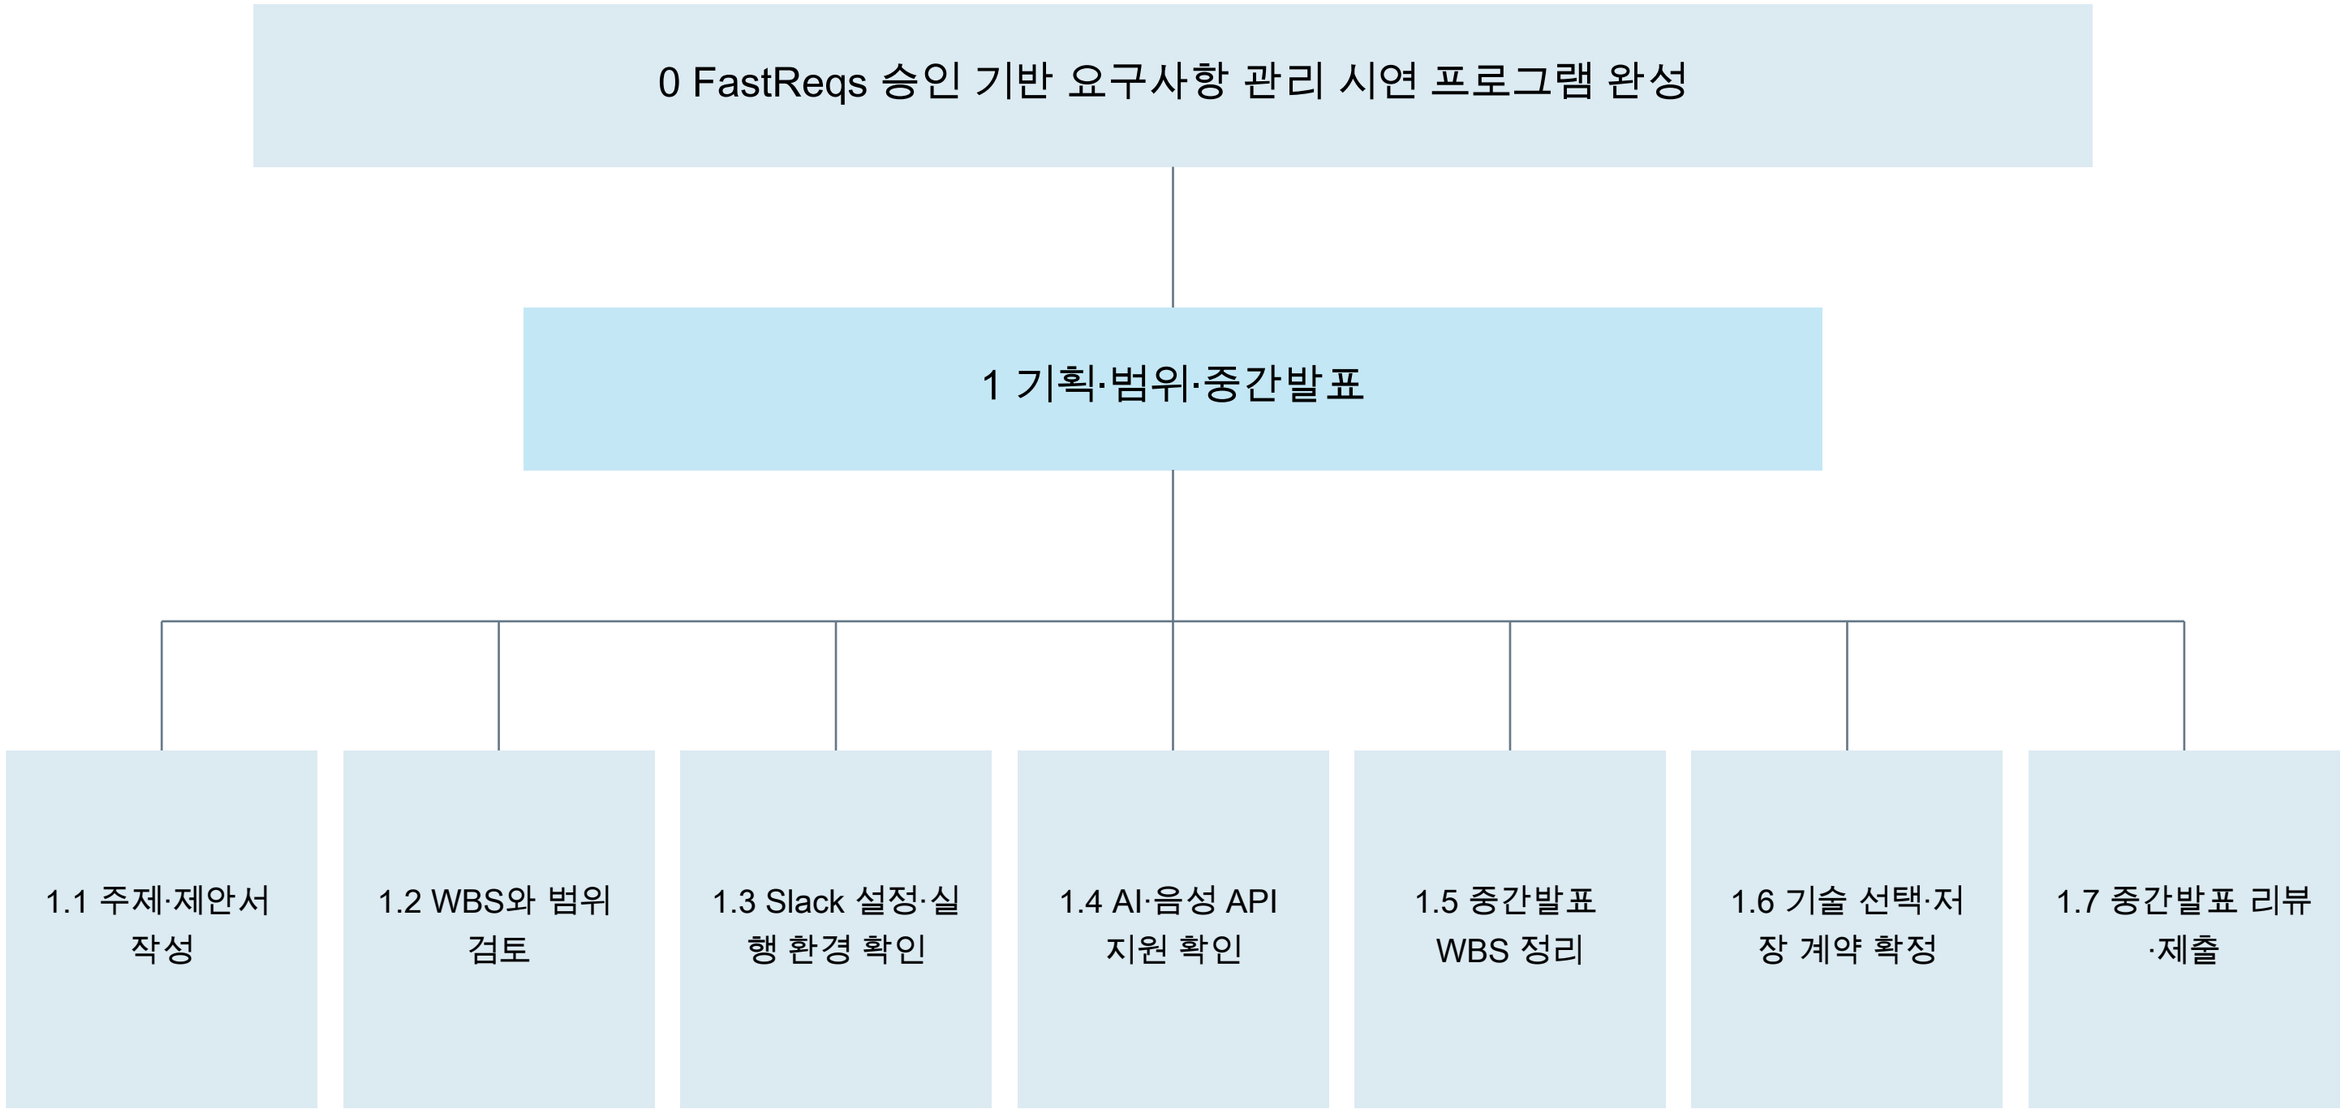

각 작업은 레벨 2다. 작업 간 진행 순서는 선행 작업 ID로 확인한다.

단계별 상세 트리 · 2 문서·승인 공통 엔진


전체 목표 → 해당 단계 → 동급 작업. 모든 작업 번호는 계획표와 동일하다.

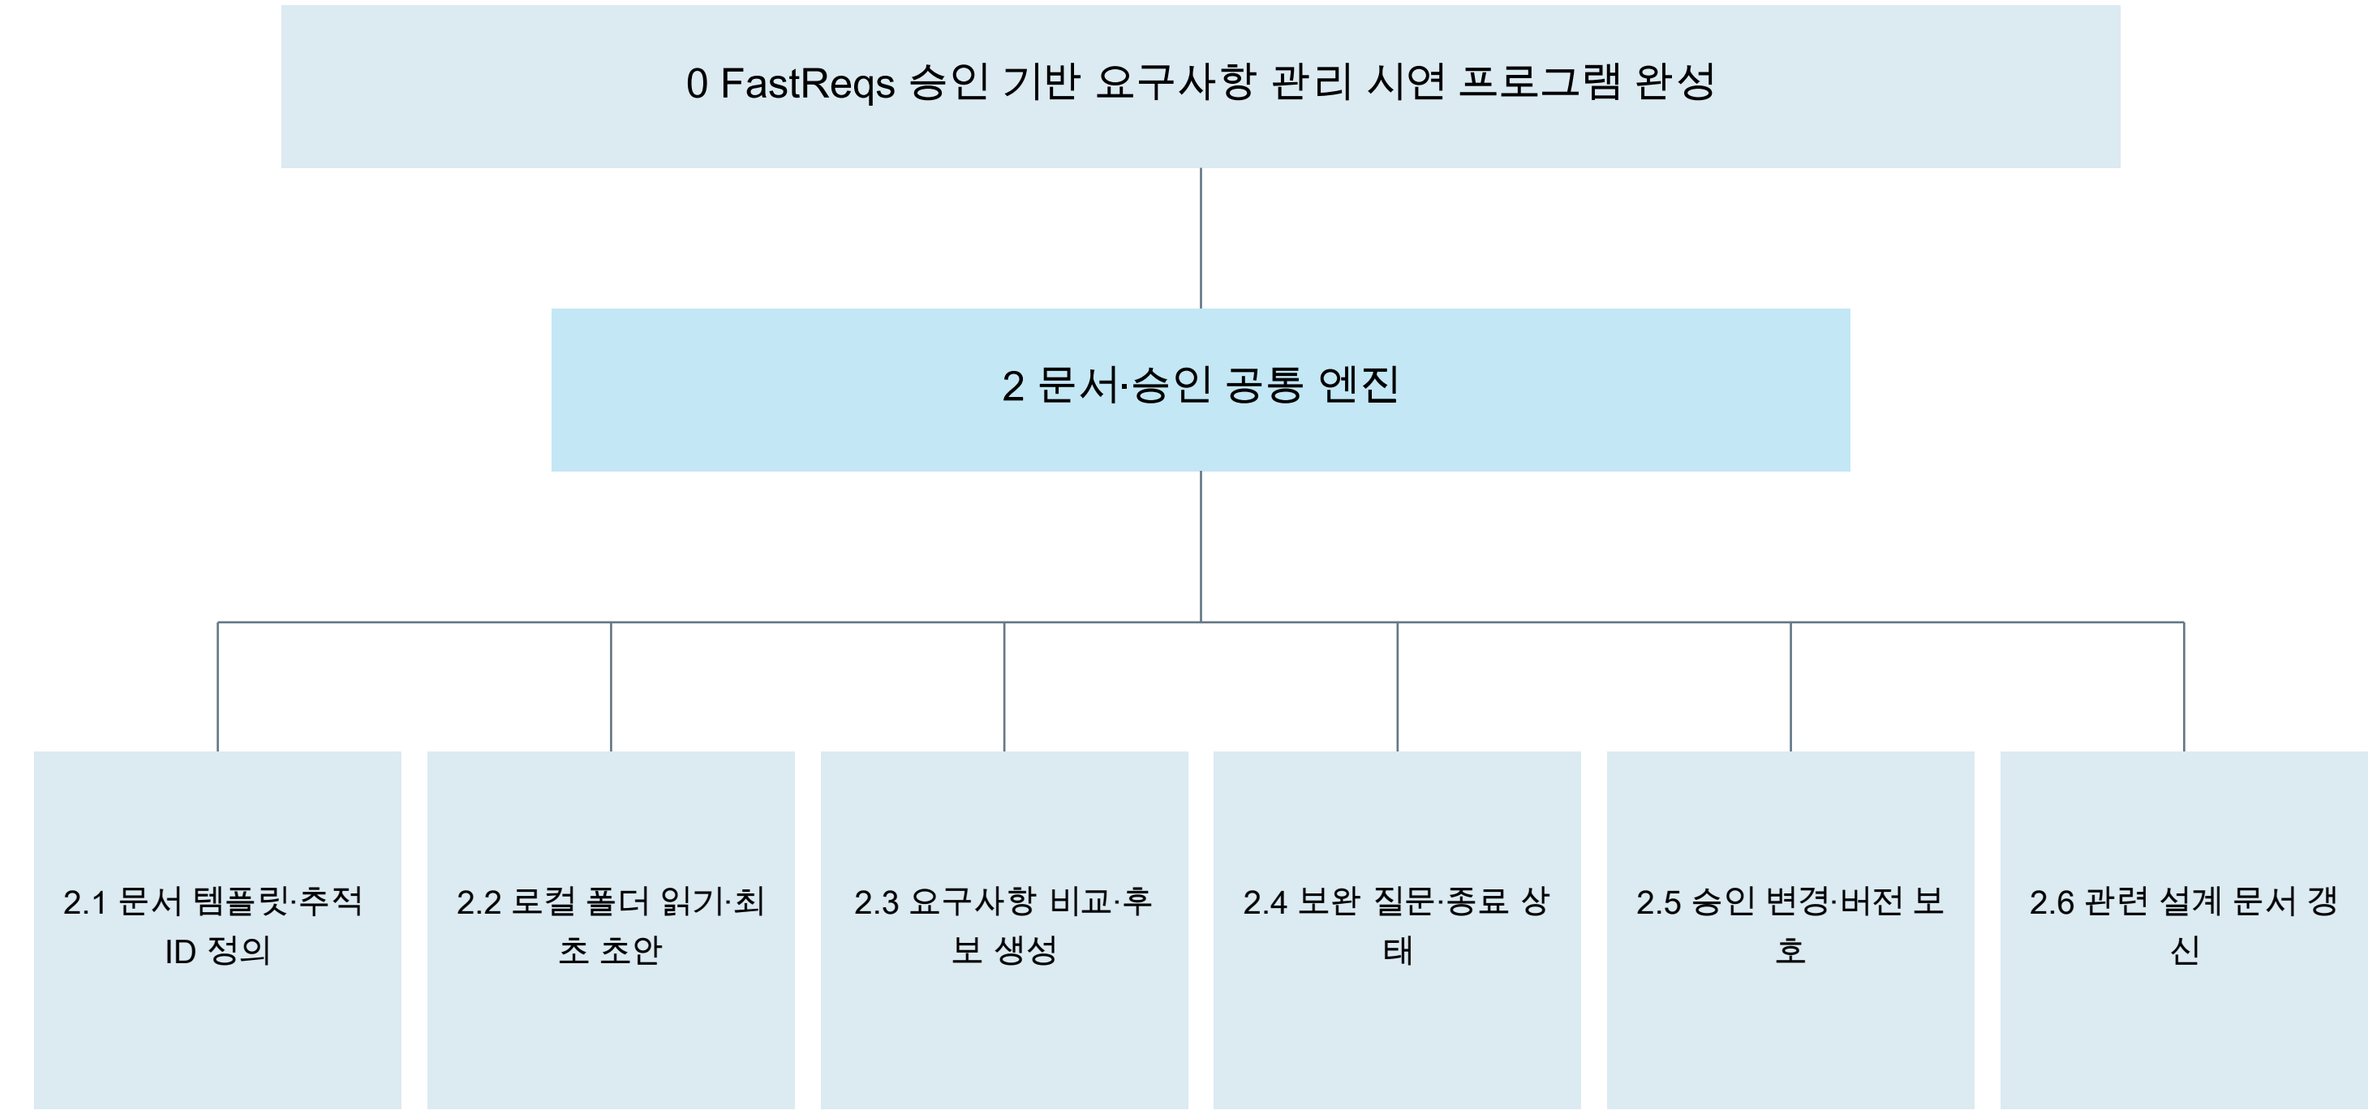

각 작업은 레벨 2다. 작업 간 진행 순서는 선행 작업 ID로 확인한다.

단계별 상세 트리 · 3 Slack 상시 봇·CLI 연결


전체 목표 → 해당 단계 → 동급 작업. 모든 작업 번호는 계획표와 동일하다.

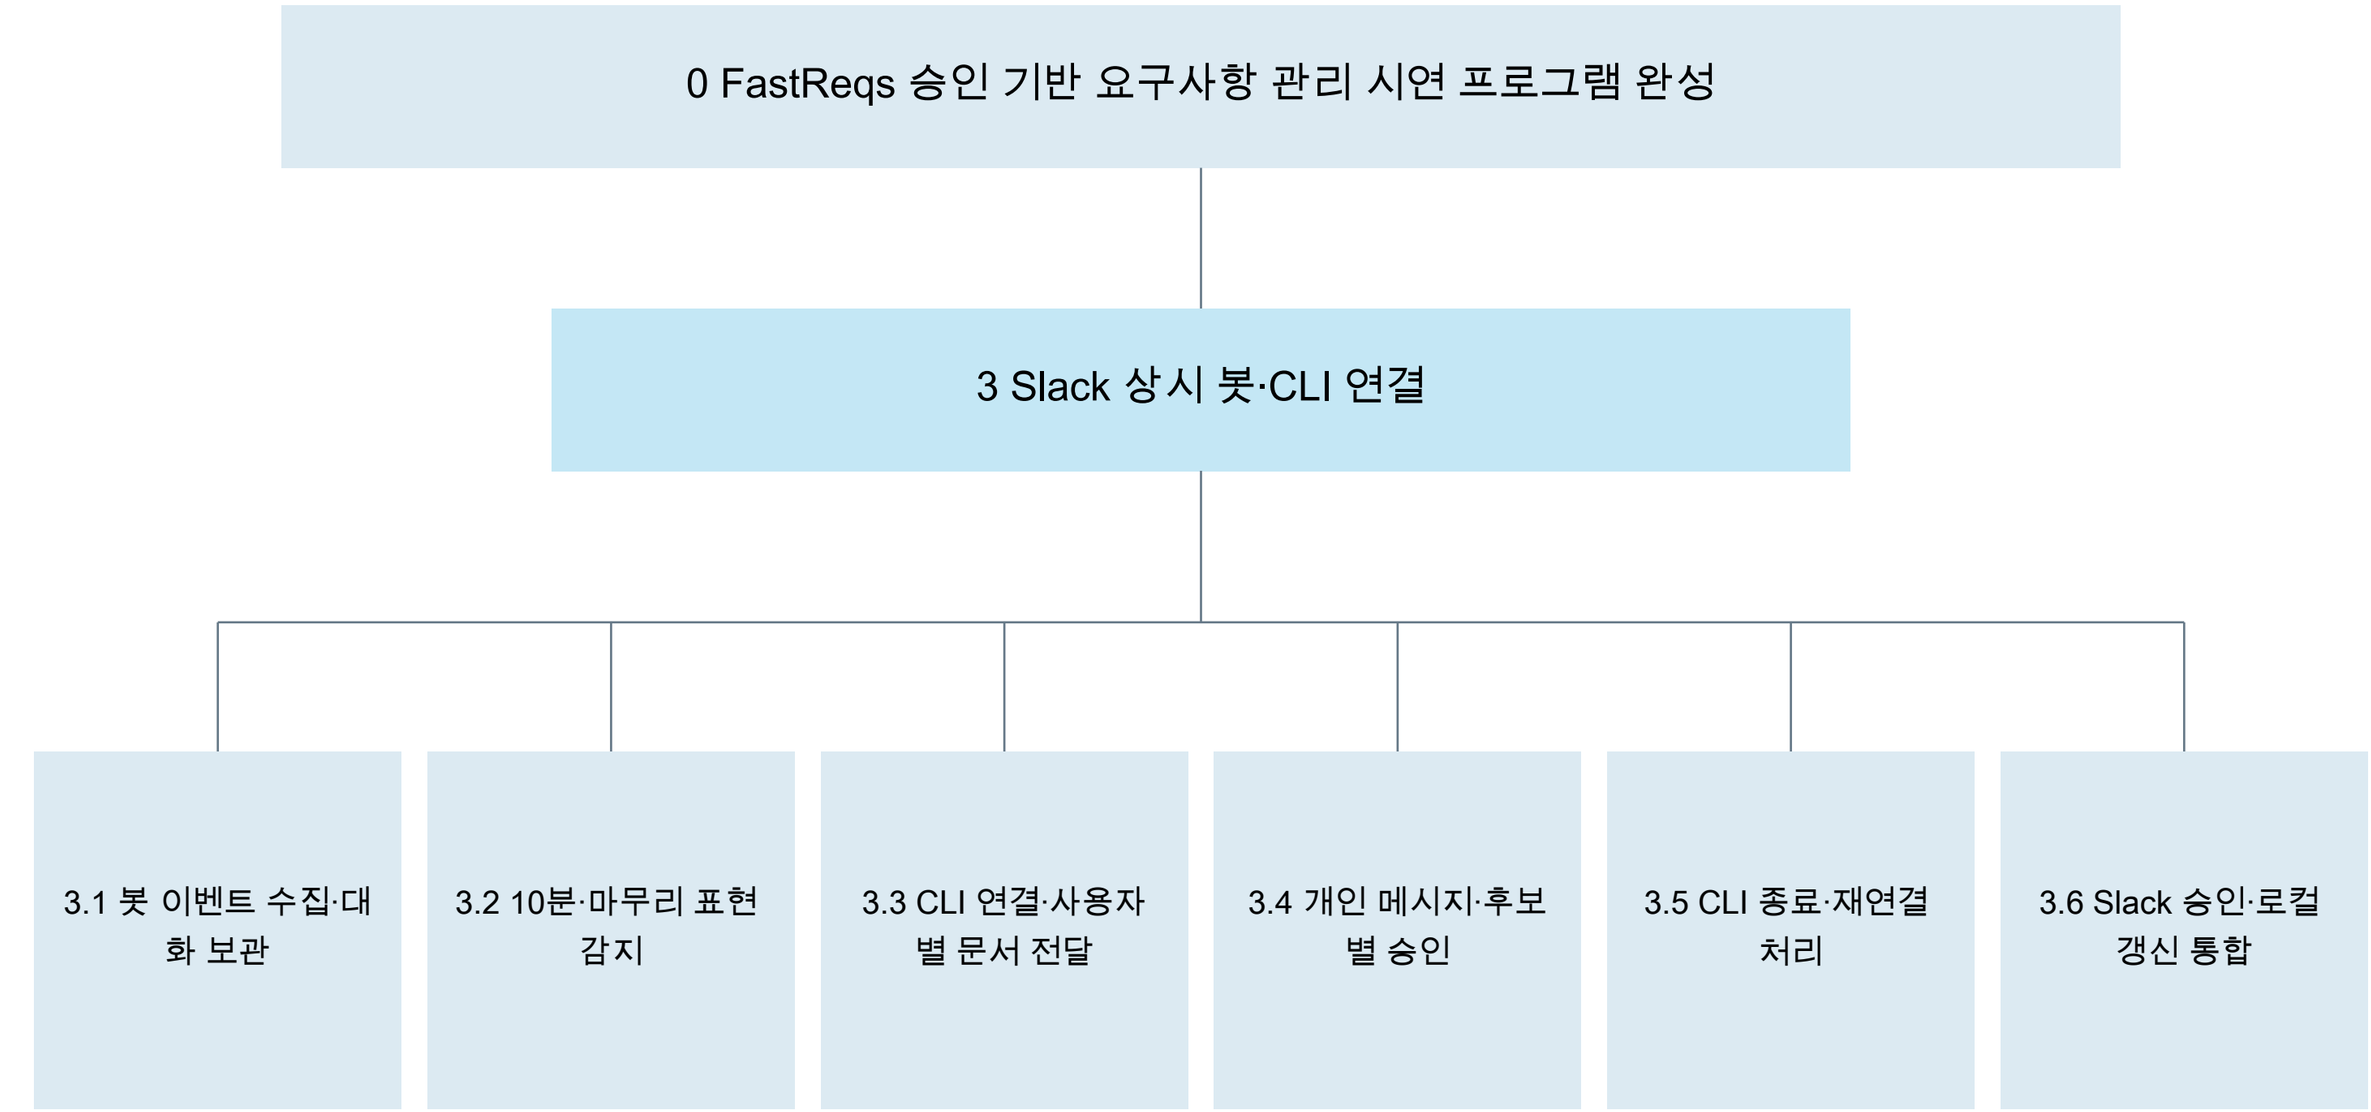

각 작업은 레벨 2다. 작업 간 진행 순서는 선행 작업 ID로 확인한다.

단계별 상세 트리 · 4 MP3 회의·충돌 검사


전체 목표 → 해당 단계 → 동급 작업. 모든 작업 번호는 계획표와 동일하다.

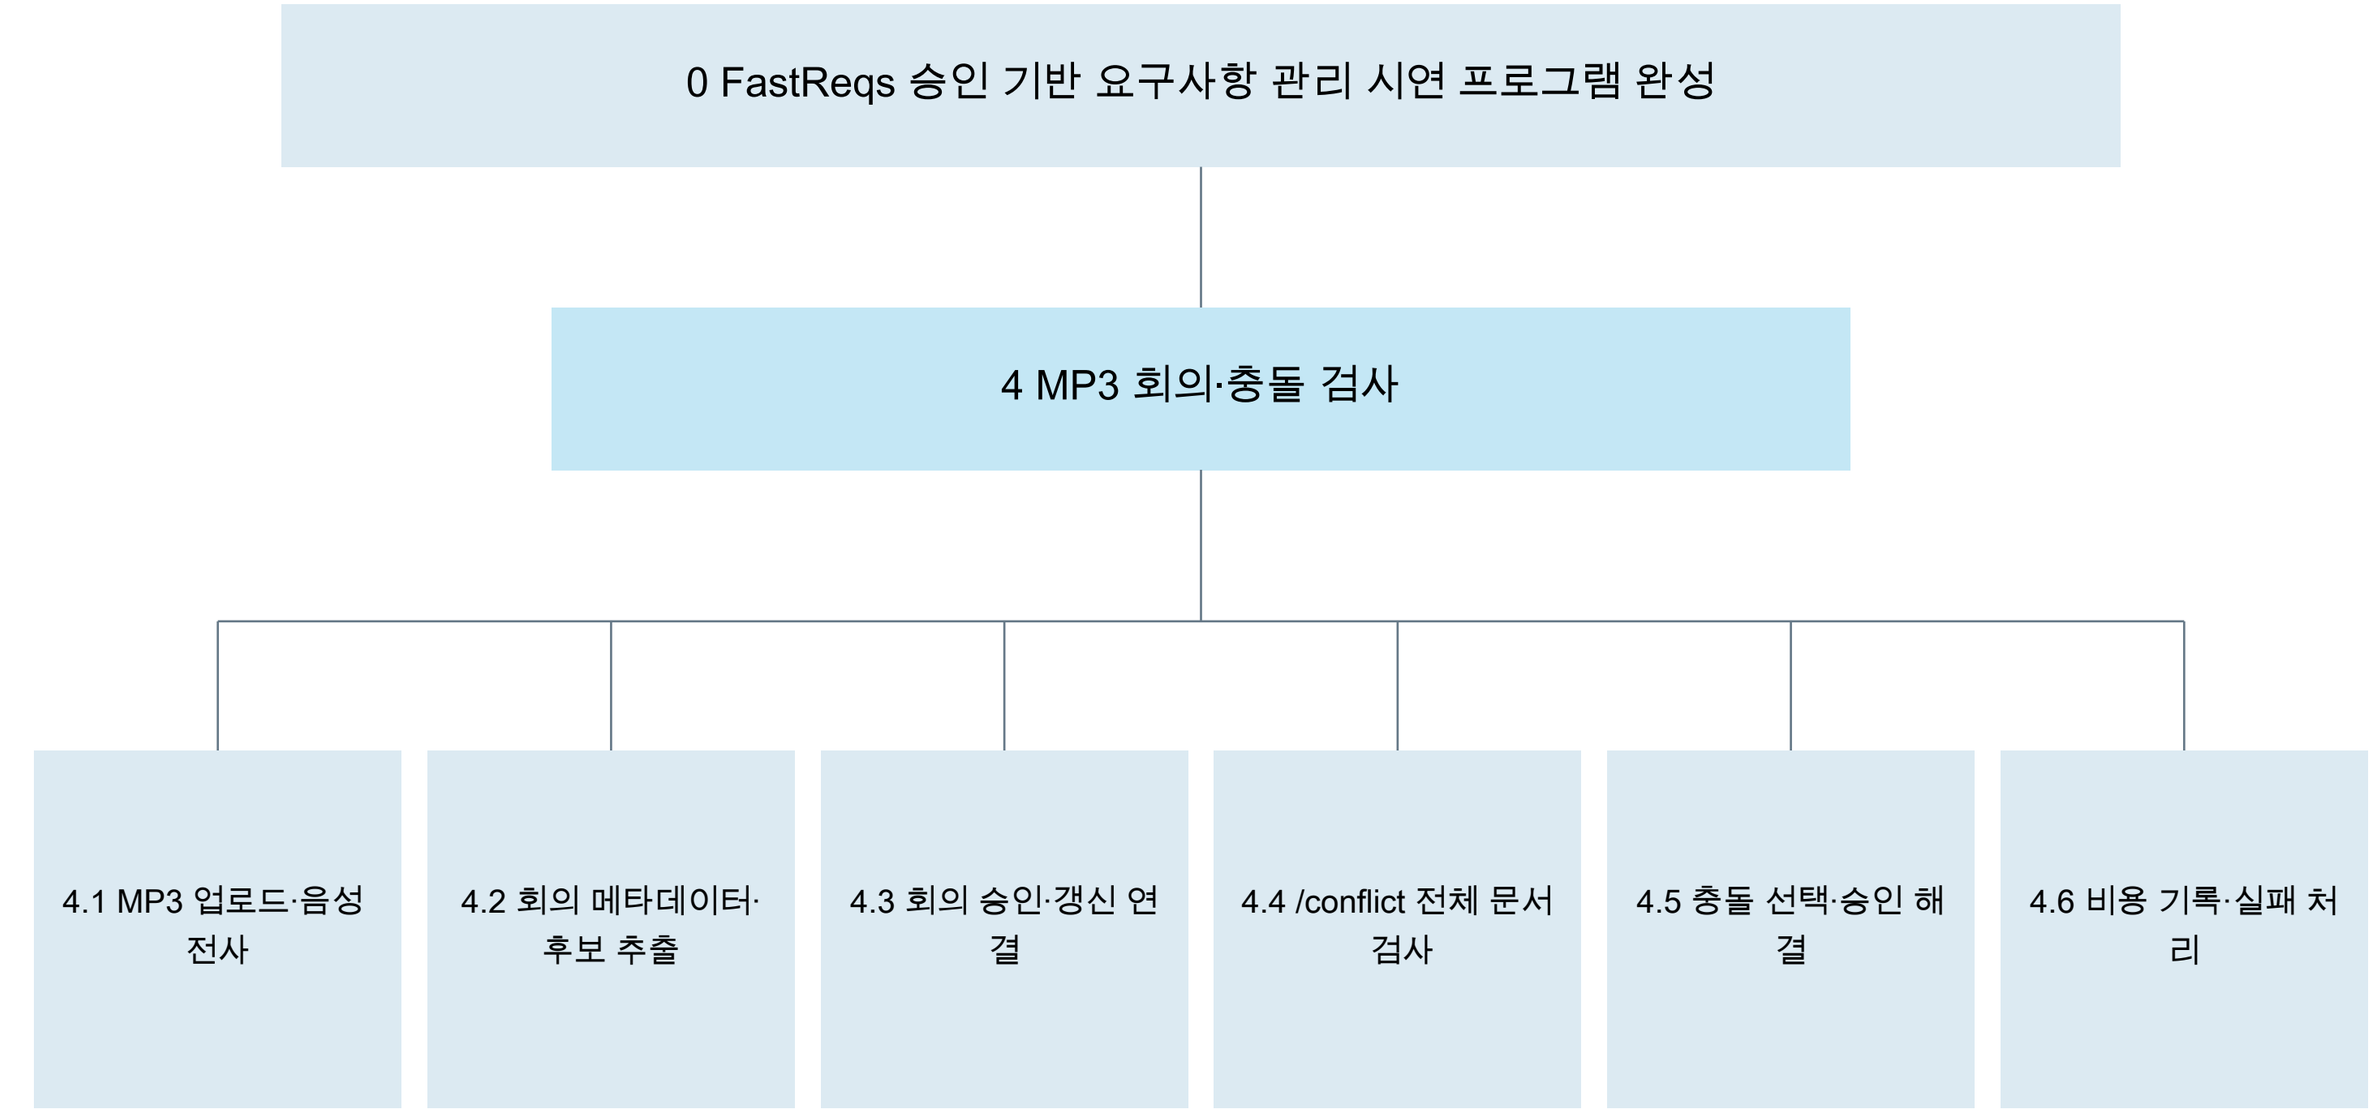

각 작업은 레벨 2다. 작업 간 진행 순서는 선행 작업 ID로 확인한다.

단계별 상세 트리 · 5 검증·시연·최종 제출

전체 목표 → 해당 단계 → 동급 작업. 모든 작업 번호는 계획표와 동일하다.

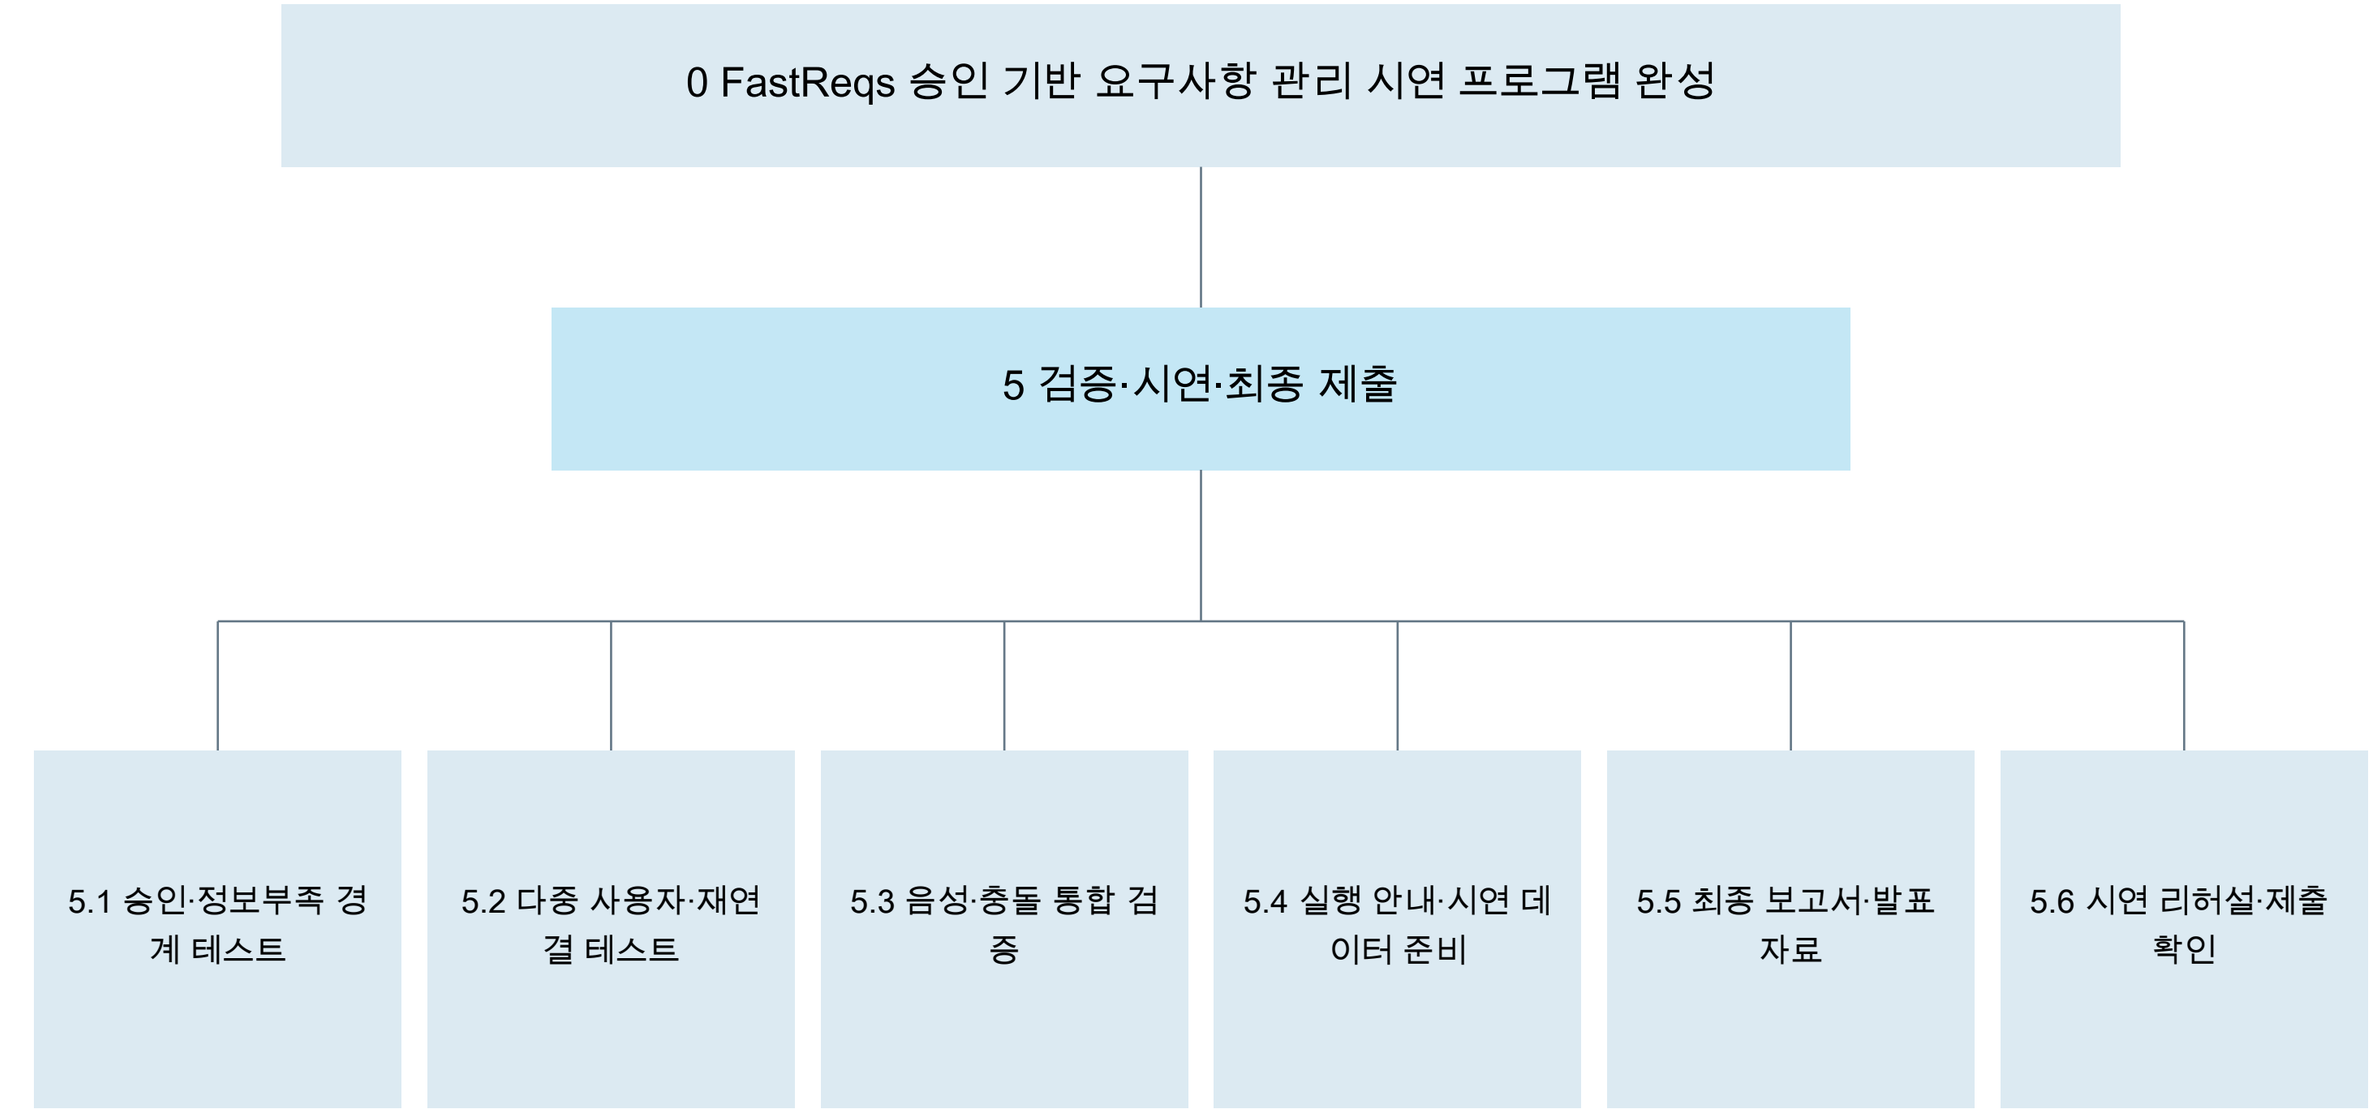

각 작업은 레벨 2다. 작업 간 진행 순서는 선행 작업 ID로 확인한다.

표형 작업분할도 · 1 기획·범위·중간발표

우선순위: 높음 = 선행 결정·마감·핵심 동작 / 보통 = 보완·검사·운영 / 낮음 = 완료 작업·보고 정리

ID	선행 작업 ID	작업 완료도	우선순위	작업 이름	기간	시작 날짜	완료 날짜
1.1	-	100%	낮음	주제·제안서 작성	미기록	미기록	미기록
1.2	1.1	0%	높음	WBS와 범위 검토	2일	2026-10-06	2026-10-07
1.3	1.1	0%	높음	Slack 설정·실행 환경 확인	2일	2026-10-06	2026-10-07
1.4	1.1	0%	높음	AI·음성 API 지원 확인	4일	2026-10-06	2026-10-09
1.5	1.2	0%	높음	중간발표 WBS 정리	2일	2026-10-12	2026-10-13
1.6	1.3,1.4	0%	높음	기술 선택·저장 계약 확정	3일	2026-10-12	2026-10-14
1.7	1.5	0%	높음	중간발표 리뷰·제출	1일	2026-10-14	2026-10-14

1.1 제안서 작성은 사용자 보고 기준 100%이며 실제 작성 날짜·기간은 미기록이다. 중간발표 정확한 제출일 확인 후 1.5·1.7 일정을 조정한다.

우선순위는 팀 검토용 제안이다. 낮음도 필수 범위이며, 선행 관계와 제출 마감을 우선한다.

표형 작업분할도 · 2 문서·승인 공통 엔진

우선순위: 높음 = 선행 결정·마감·핵심 동작 / 보통 = 보완·검사·운영 / 낮음 = 완료 작업·보고 정리

ID	선행 작업 ID	작업 완료도	우선순위	작업 이름	기간	시작 날짜	완료 날짜
2.1	1.6	0%	보통	문서 템플릿·추적 ID 정의	2일	2026-10-19	2026-10-20
2.2	2.1	0%	높음	로컬 폴더 읽기·최초 초안	2일	2026-10-21	2026-10-22
2.3	2.2	0%	높음	요구사항 비교·후보 생성	3일	2026-10-23	2026-10-25
2.4	2.3	0%	보통	보완 질문·종료 상태	3일	2026-10-26	2026-10-28
2.5	2.3	0%	높음	승인 변경·버전 보호	4일	2026-10-26	2026-10-29
2.6	2.1,2.5	0%	보통	관련 설계 문서 갱신	3일	2026-10-30	2026-11-01

기간은 시작일과 완료일을 포함한 달력 일수다. 작업 완료도는 현재 0%이며 검증된 산출물을 기준으로 갱신한다. 같은 주 안의 선행 작업은 완료 순서를 지킨다.

우선순위는 팀 검토용 제안이다. 낮음도 필수 범위이며, 선행 관계와 제출 마감을 우선한다.

표형 작업분할도 · 3 Slack 상시 봇·CLI 연결

우선순위: 높음 = 선행 결정·마감·핵심 동작 / 보통 = 보완·검사·운영 / 낮음 = 완료 작업·보고 정리

ID	선행 작업 ID	작업 완료도	우선순위	작업 이름	기간	시작 날짜	완료 날짜
3.1	1.3,1.6	0%	높음	봇 이벤트 수집·대화 보관	3일	2026-11-02	2026-11-04
3.2	3.1	0%	보통	10분·마무리 표현 감지	4일	2026-11-05	2026-11-08
3.3	2.2,3.1	0%	높음	CLI 연결·사용자별 문서 전달	4일	2026-11-05	2026-11-08
3.4	2.4,3.3	0%	높음	개인 메시지·후보별 승인	3일	2026-11-09	2026-11-11
3.5	2.5,3.3	0%	높음	CLI 종료·재연결 처리	3일	2026-11-09	2026-11-11
3.6	2.6,3.2,3.4,3.5	0%	높음	Slack 승인·로컬 갱신 통합	4일	2026-11-12	2026-11-15

기간은 시작일과 완료일을 포함한 달력 일수다. 작업 완료도는 현재 0%이며 검증된 산출물을 기준으로 갱신한다. 같은 주 안의 선행 작업은 완료 순서를 지킨다.

우선순위는 팀 검토용 제안이다. 낮음도 필수 범위이며, 선행 관계와 제출 마감을 우선한다.

표형 작업분할도 · 4 MP3 회의·충돌 검사

우선순위: 높음 = 선행 결정·마감·핵심 동작 / 보통 = 보완·검사·운영 / 낮음 = 완료 작업·보고 정리

ID	선행 작업 ID	작업 완료도	우선순위	작업 이름	기간	시작 날짜	완료 날짜
4.1	1.4,1.6	0%	높음	MP3 업로드·음성 전사	2일	2026-11-16	2026-11-17
4.2	4.1,2.3	0%	보통	회의 메타데이터·후보 추출	2일	2026-11-18	2026-11-19
4.3	3.6,4.2	0%	높음	회의 승인·갱신 연결	3일	2026-11-20	2026-11-22
4.4	2.6	0%	보통	/conflict 전체 문서 검사	3일	2026-11-23	2026-11-25
4.5	4.4,2.5	0%	보통	충돌 선택·승인 해결	4일	2026-11-26	2026-11-29
4.6	3.6,4.3	0%	보통	비용 기록·실패 처리	5일	2026-11-23	2026-11-27

기간은 시작일과 완료일을 포함한 달력 일수다. 작업 완료도는 현재 0%이며 검증된 산출물을 기준으로 갱신한다. 같은 주 안의 선행 작업은 완료 순서를 지킨다.

우선순위는 팀 검토용 제안이다. 낮음도 필수 범위이며, 선행 관계와 제출 마감을 우선한다.

표형 작업분할도 · 5 검증·시연·최종 제출

우선순위: 높음 = 선행 결정·마감·핵심 동작 / 보통 = 보완·검사·운영 / 낮음 = 완료 작업·보고 정리

ID	선행 작업 ID	작업 완료도	우선순위	작업 이름	기간	시작 날짜	완료 날짜
5.1	3.6,4.3	0%	높음	승인·정보부족 경계 테스트	3일	2026-11-30	2026-12-02
5.2	3.6	0%	높음	다중 사용자·재연결 테스트	4일	2026-11-30	2026-12-03
5.3	4.5,4.6	0%	보통	음성·충돌 통합 검증	6일	2026-11-30	2026-12-05
5.4	5.1,5.2,5.3	0%	보통	실행 안내·시연 데이터 준비	2일	2026-12-07	2026-12-08
5.5	5.1,5.2,5.3	0%	낮음	최종 보고서·발표 자료	3일	2026-12-07	2026-12-09
5.6	5.4,5.5	0%	높음	시연 리허설·제출 확인	3일	2026-12-10	2026-12-12

기간은 시작일과 완료일을 포함한 달력 일수다. 작업 완료도는 현재 0%이며 검증된 산출물을 기준으로 갱신한다. 같은 주 안의 선행 작업은 완료 순서를 지킨다.

우선순위는 팀 검토용 제안이다. 낮음도 필수 범위이며, 선행 관계와 제출 마감을 우선한다.
